

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่กรมควบคุมโรค “ผู้ว่าจ้าง” และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง โดยก่อสร้าง ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในวงเงินค่าจ้างรวมทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน ๕๔๐ วัน (ห้าร้อยสี่สิบ) วัน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาจ้าง เลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งต่อมา “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงจัดทำสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง และยินยอมถือเอาสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมควบคุมโรค เลขที่ ๘๖๐๑ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง กรมควบคุมโรค โดย นายนิติ เหนานรักษ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง ซึ่ง ทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๖๒ ถนนพระพุทธบาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายกมลสิทธิ์ วาจากิจรุ่งเรือง ผู้มีอำนาจตามกฎหมายผู้แทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พช.๐๐๐๐๓๘ ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้แก้ไขเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑ ผแนวก ๑ แบบรูป (๑) โครงการจัดทำอาคารอยู่อาศัยรวมและบ้านพักของสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) แบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ หน้า ๑๗/๒๒ ประตู D1 จากเดิม “ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๖๐ เมตร” เป็น “ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๓๐ เมตร”

ข้อ ๒ ให้แก้ไขเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑ ผแนวก ๑ แบบรูป (๑) โครงการจัดทำอาคารอยู่อาศัยรวมและบ้านพักของสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) แบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ หน้า ๑๘/๒๒ หน้าต่าง W1 จากเดิม “ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๖๐ เมตร” เป็น “ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๓๐ เมตร”



ข้อ ๓ ให้...

ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
“๒.๑๐ ผนวก ๑๐ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๔ (สี่) หน้า”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
“๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบแปลนแก้ไขขนาดประตู D1 และ หน้าต่าง W1 โครงการอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
“๒.๑๒ ผนวก ๑๒ หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งตารางเปรียบเทียบราคาประตู-หน้าต่าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
จำนวน ๔ (สี่) หน้า ที่แนบท้ายสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ เป็นเอกสารตามข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ ของสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๗ ให้เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา แบบแปลนแก้ไขขนาดประตู D1 และ หน้าต่าง W1
โครงการอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ที่แนบท้ายสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ เป็นเอกสารตามข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ ของสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๘ ให้เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งตารางเปรียบเทียบราคาประตู-หน้าต่าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า
ที่แนบท้ายสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ เป็นเอกสารตามข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑๒
ผนวก ๑๒ ของสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในสัญญา แก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๘ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและได้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒๔,๒๖๘,๖๐๔.๒๐ บาท
(ยี่สิบสี่ล้านสองพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๕๘๗,๖๖๕.๗๐ บาท
ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ
จำนวน ๘ (แปด) งวด (๕๐ วัน ต่องวด)

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกข้อความในสัญญา แก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๙ งวดที่ ๕ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

**“งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๕,๓๑๖.๙๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพัน
สามร้อยสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน**

๕.๑ เดินท่องานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๒ และงานที่ระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๒
(อาคาร ๑ และอาคาร ๒)

๕.๒ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒)

๕.๓ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ตกแต่งผิว) (อาคาร ๑ และอาคาร ๒)



๕.๔ ติดตั้ง...

๕.๔ ตัดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง และช่องแสงชั้นที่ ๑ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒)
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (๖๐ วัน)”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **๒๔,๒๖๘.๖๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาการทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๑๒ ส่วนข้อความอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายนิติ เทตานุรักษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

(ลงชื่อ).....

(นายกมลสิทธิ์ วาจากิจรุ่งเรือง)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนันทพร วงษ์ละคร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปรีสุทธิ์ บุญยุบล)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐	โครงการก่อสร้าง	อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)-(ด้านแผ่นดินไหว) จำนวน 2 หลัง				
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดสระบุรี				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
☐	แบบเลขที่	11062	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	819 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	จำนวนชั้น	3 ชั้น
☐	ราคาตัววัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร				ประจำเดือน
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน					
☐	ปรับราคาเมื่อเดือน	☐ แจ้งราคาเมื่อเดือน				

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคาและปรับราคาตาม Factor F ใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างรวม			หมายเหตุ
		งานเดิม	งานใหม่	รวม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	257,256.44	184,969.05		
	ราคารวมค่า Factor F 1.2303	257,256.44	227,568.30		
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	รวมเงิน (งานเดิม - งานใหม่)	-	29,683.05		
	คิดเป็นเงินคืนทั้งสิ้นโดยประมาณ		29,683.05		
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		บาท / ตร.ม.
	(ต่อหน้าตาราง)				สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสตางค์

ผู้ประมาณราคาและตรวจสอบ

ลงชื่อ นายช่าง.....ชำนาญงาน

(นายกิตติพงษ์ พึ่งอัน)



แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

[illegible]

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารชุดรอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)-(ด้านแผ่นดินไหว) จำนวน 2 หลัง	แบบเลขที่	11062		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี	เอกสารเลขที่			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก			หมายเหตุ
			งานเดิม	งานใหม่	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-	-	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานสิ่งแวดล้อม และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		209,096.44	184,969.76	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์				
	2.3 งานระบบปรับอากาศ				
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ตามบัญชีราคา (ค่าเช่า)				
	(คิดในราคาเหมารวม รวมค่าวัสดุและค่าภาษีในแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายที่มิใช่ตามบัญชีราคา กำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	-	




บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)-(ด้านแผ่นดินไหว) จำนวน 2 หลัง	แบบเลขที่	11062
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี	เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณการ		พื้นที่อาคาร	819.00 ตร.ม.
ผู้รับราคา/แก้ไข		วันที่รับราคา	มิถุนายน 2566
		จำนวนชั้น	3 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ			

[illegible]

(นางชื่อ).....ผู้ว่าฯ
 (นางชื่อ).....ผู้รับแจ้ง
 (นางชื่อ).....พยาน
 (นางชื่อ).....ผู้ต้องหา




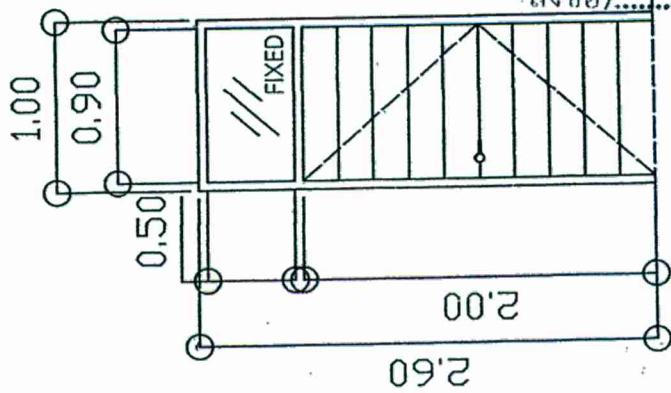

(D1)

แบบเดิม


ขนาดกว้าง 1,00 x 2,60 ม.

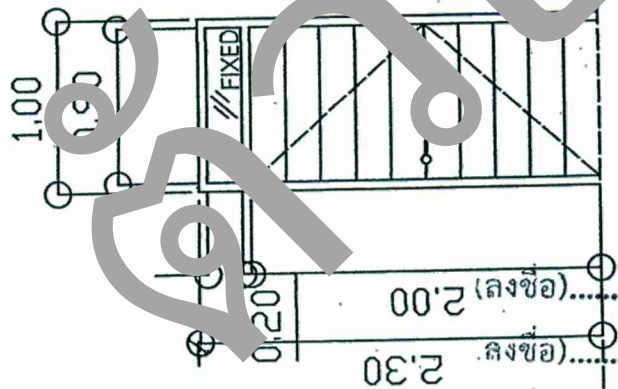

(D1)

แบบแก้ไข


ขนาด 1,00 x 2,30 ม.

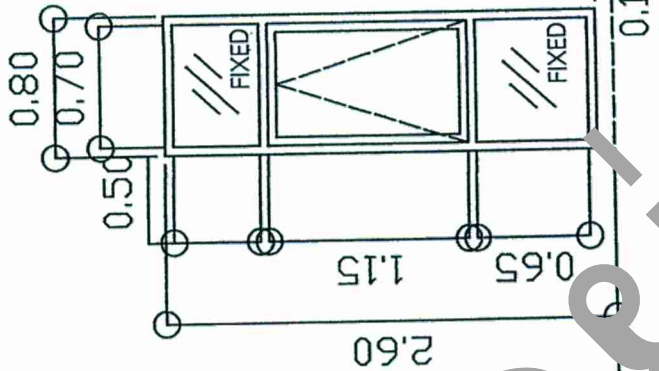

(W1)

แบบเดิม

ขนาด 0,80 x 2,60 ม.

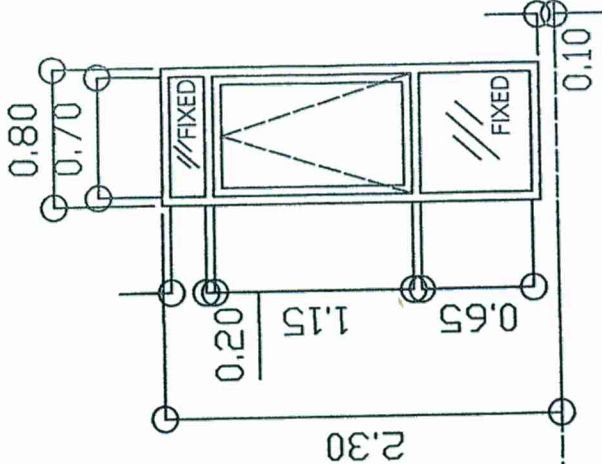

(W1)

แบบแก้ไข

ขนาด 0,80 x 2,30 ม.

Sawat Construction		โครงการอาคารชุดรอบตัว 12 หมู่ที่ 2 (ต.บ.) สำนักงานเมืองในควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี	
วิศวกรผู้ออกแบบ	นาย กนกพร ราชกิจรุ่งเรือง กว.9560	วิศวกรควบคุมงาน	นาย ชุมพันธ์ ราชกิจรุ่งเรือง
วิศวกรโครงสร้าง		วิศวกรไฟฟ้า	
วิศวกรเครื่องกล		สถาปนิก	
เขียนแบบ		ควบคุมงาน	
เจ้าของโครงการ		ผู้อนุมัติ	
ผู้อนุมัติ			



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน
ผู้ตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง

๒๖๒ ถนนพระพุทธบาท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งตารางเปรียบเทียบราคาประตู-หน้าต่าง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง เลขที่ ๘๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางการเปรียบเทียบราคาประตู-หน้าต่าง

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบแก้ไขประตู-หน้าต่าง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ห้าง ฯ ได้รับจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตร.ม. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาราคาก่อนส่งมอบจากจำนวนเงิน ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๒๔,๒๙๘,๒๙๘.๒๕ (ยี่สิบสี่ล้านสองพันเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างและสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อ้างถึง

ห้าง ฯ มีความประสงค์ที่จะส่งตารางการเปรียบเทียบราคาพร้อมแบบแก้ไขประตู-หน้าต่าง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาต่อไป

จึงเรียนขอทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมลสิทธิ์ วาจาจักรรุ่งเรือง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ สุวิทย์ก่อสร้าง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- เมื่อ 10 ต.ค. 66


- ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตร.ม. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาราคาก่อนส่งมอบจากจำนวนเงิน ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๒๔,๒๙๘,๒๙๘.๒๕ (ยี่สิบสี่ล้านสองพันเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างและสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อ้างถึง
- ห้าง ฯ มีความประสงค์ที่จะส่งตารางการเปรียบเทียบราคาพร้อมแบบแก้ไขประตู-หน้าต่าง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาต่อไป
- จึงเรียนขอทราบและโปรดพิจารณา

นายกมลสิทธิ์ วาจาจักรรุ่งเรือง

2/3 หน้า ๑

- 1. การนับเงิน ปรับลดค่าก่อสร้าง ข้างพื้นที่ส่วนจำกัด สุราษฎร์ธานี
ยื่นถึง ๑๐ วันนับจากเงินค่าปรับลดค่าก่อสร้างในงวดงานที่ ๕
- ๒. หากมีการปรับลดเงินงบประมาณในการก่อสร้าง
นอกจาก สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ๒๐๐๐ ล้านบาท



คำอธิบาย

ตารางเปรียบเทียบราคาประตู-หน้าต่างต่าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.สระบุรี

จำนวนชุด
160
เลขที่รับ
วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
เวลา 14.1๒

สัญญาจ้างเลขที่

๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันเริ่มสัญญา

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เจ้าของงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวิทย์ก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวทโยสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ

นางกมลสิทธิ์ วาจากิจรุ่ง

ผู้จัดทำรายการ นายกมลสิทธิ์ วาจากิจรุ่งเรือง

นายกมลสิทธิ์ วาจากิจรุ่งเรือง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย			
	หมวดงานประตู่-หน้าต่าง					
๑	D๑ ขนาด ๑.๐๐x๒.๖๐ ม.	๘	ชุด	๙,๘๖๖.๐๑	๕๔๑.๔๔	๑๐,๔๐๗.๔๕
๒	W๑ ขนาด ๐.๘๐x๒.๖๐ ม.	๑๒	ชุด	๙,๔๙๘.๐๑	๙๕๕.๐๖	๑๐,๔๕๓.๐๗
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						๒๐,๘๖๐.๕๒
ค่า Factor F ที่ใช้คิดราคาค่าอำนวยการ,ความผันผวน,ดอกเบี้ย,กำไร,ภาษีทั้งหมด						
Factor F ที่ใช้คิดราคาค่าอำนวยการ,ความผันผวน,ดอกเบี้ย,กำไร,ภาษีทั้งหมด						๑.๒๓๐๓
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						๒๒,๐๙๐.๕๕

இந்தியா

๑. คำว่าสถิติใช้ตามเกณฑ์ราคาของไบเสมราคาของผู้รับจ้าง

๒. ค่าแรงงานจากใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง

๓. ค่า Factor F ใช้ตามประมาณราคาของผู้รับจ้าง

๔. การชำระเงินปรับ-ลดค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีให้หักเงิน

ค่าปรับ-ลดดังกล่าวในงวดงานที่ ๕

๕. หากมีการปรับ-ลดวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง ขอใช้หลักประกันเดิม

จำนวน... ประตุ-หน้าต่างตาม... แบบรายการ

จำนวนรายการประติ-หน้าต่างตามรูป

จำนวนราคาที่ดินค่าประตุ-ห... เป็นจำนวนเงิน

(สองหมื่นเก้าพันหกร้อย...)


២៥៧,២៥១.៣៥ បាវ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପ

๒๔,๖๘๓.๐๕ บาท



นายกมลสิทธิ์ วาจาจิรุ่งเรือง (หุ้นส่วนผู้จัดการ)





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๐๖๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๙๕๗๕

ที่ สธ ๐๔๐๕.๕/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ลงนามในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง)
จำนวน ๒ หลัง ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗

เรียน หัวหน้ากลุ่มพัสดุ (ผ่านหัวหน้างานสัญญาฯ)

ความเป็นมา

๑. ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ กรมควบคุมโรคได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง โดยใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามแบบโครงการจัดทำอาคารอยู่อาศัยรวมและบ้านพักของสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) แบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ ของแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๘๘ แผ่น แบบรูปและรายการละเอียด จำนวน ๗ แผ่น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร โดยก่อสร้าง ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด และเสนอถูกต้องเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว จ่ายจากเงินบำรุงของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบงาน ๕๔๐ วัน (๘ งวดงาน-ปี) ครบกำหนดสัญญาภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๔๐๕.๕/๓๐๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กรมควบคุมโรคอนุมัติให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ ในส่วนของสถาปัตยกรรม งานประตู-หน้าต่าง คิดเป็นเงินลดจำนวนเงิน ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสตางค์) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) ยินดีให้หักเงินดังกล่าวในงวดที่ ๕ และขอให้หลักประกันสัญญาฉบับเดิม

๓. ตามหนังสือ ที่ ๐๔๐๕.๕/๓๐๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กองบริหารการคลังได้ส่งร่างสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ ให้กองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบก่อนนำเสนอกรมฯ ลงนามในสัญญา

๔. ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๔๐๒.๔/๑๕๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กองกฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ เรียบร้อยแล้วแจ้งกองบริหารการคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

๑. การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑

ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ ๓๕๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ข้อ ๔ กรมควบคุมโรค มอบหน้าที่และอำนาจให้ นายนิติ เทตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มีหน้าที่และอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้ง การลงนาม การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยงบประมาณวงเงินไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)

๒. กองบริหารการคลัง ได้จัดทำสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ ของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง โดยได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาจากกองกฎหมาย ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขตามที่กองกฎหมายเสนอแนะแนบมาท้ายบันทึกนี้แล้ว และข้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) ได้ลงนามในสัญญาตามสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรเสนอกรมฯ ลงนามในสัญญาต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอผู้อำนวยการกองบริหารการคลังนำเสนอกรมฯ ลงนามในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ ของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นางสาว สุทธิ บุญยกุล

อธิบดีกรมการพัสดุปฏิบัติการ

ที่ สธ ๐๐๐๐๕-๒๖๑ ลง ๔ มี.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ตามที่กรมควบคุมโรค อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ กับข้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง และกลุ่มพัสดุ ได้จัดทำร่างสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ดังกล่าว ส่งให้กองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบก่อนนำเสนอกรมฯ ลงนามในสัญญา นั้น

กองกฎหมาย ได้ตรวจร่างสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ กับข้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง และกลุ่มพัสดุได้ดำเนินการแก้ไขตามที่กองกฎหมายเสนอแนะ และข้างฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอรกราฯ ลงนามในสัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ห้องรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
เลขรับ ๑๕๐
วันที่ - ๔ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๔๙ น.

[Signature]

(นางสาวนันทพร วงษ์ละคร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งแทนหัวหน้ากลุ่มพัสดุ

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ห้องผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
เลขที่ ๑๕๕๐
รับวันที่ - ๔ มี.ค. ๒๕๖๗
วันที่ - ๔ มี.ค. ๒๕๖๗

ที่ สธ ๐๔๐๕...../๑๖๒๕๖๗
เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค - ๔ มี.ค. ๒๕๖๗

เพื่อโปรดลงนามในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างจ้างงานชั่วคราวรายชั่วโมง ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายนิติ ติธรรมธรา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

- ๔ มี.ค. ๒๕๖๗

ลงนามแล้ว

(นายนิติ เหน็ดานุรักษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

- ๔ มี.ค. ๒๕๖๗

- ☐ กลุ่มบริหารทั่วไป
- ☐ กลุ่มงบประมาณ
- ☐ กลุ่มบัญชี
- ☐ กลุ่มการเงิน
- ☒ กลุ่มพัสดุ - ๔ มี.ค. ๒๕๖๗
- ☐ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
- ☐ กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ

[Signature] **วิมล งามประดิษฐ์ ส.ม.๖ - ๑๕๖๖๖**

ที่ พช. 000038



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2515 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0653515000130

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 5 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายกมลสิทธิ์ วาจากิจรุ่งเรือง

จำนวน

ลงทุนด้วยเงิน

1,300,000.00 บาท

2. นายชนะพันธ์ วาจากิจรุ่งเรือง

จำนวน

ลงทุนด้วยเงิน

1,000,000.00 บาท

3. นายวีรชัย วาจากิจ

จำนวน

ลงทุนด้วยเงิน

1,000,000.00 บาท

4. นางอรพินธุ์ วาจากิจรุ่งเรือง

จำนวน

ลงทุนด้วยเงิน

1,300,000.00 บาท

5. นายรุ่งอรุณ ทอ...

จำนวน

ลงทุนด้วยเงิน

1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายกมลสิทธิ์ วาจากิจรุ่งเรือง

2. นางอรพินธุ์ วาจากิจรุ่งเรือง/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จดทะเบียนนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 262 ถนนพระพุทธบาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 12 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

7. รายการอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ดังนี้

หุ้นส่วนผู้จัดการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญห้าง/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Toward Digital
Transformation



ที่ พช. 000038



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

(นายอารีดิษฐ์ ชื่นศิริ)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ พช. 000038

1. ห้างนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์จะวัฒนากุลก่อสร้าง ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2531/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้ ซึ่ง สอดคล้องทางกฎหมาย เท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่า มีความอันเป็นสาระสำคัญจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 12 ข้อ ดังนี้

(1) รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และงานโยธาทุกชนิด

(2) รับจ้างทำถาวรขนส่งสินค้าและคนโดยสาร

(3) ทำการซื้อขายพืชไร่ทุกชนิด เช่น ข้าวโพด ถั่ว งา ฝ้าย

(4) ทำการจำหน่ายเครื่องวัสดุก่อสร้างทุกชนิด จำหน่ายเครื่องมือก่อสร้างทุกชนิด

(5) ทำการเป็นนายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภท
(เว้นกิจการประกันภัยการหาสมาชิกให้กับสมาคม และการซื้อขายหลักทรัพย์)

(6) ทำการจำหน่ายสิ่งตีพิมพ์ทุกชนิด

(7) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยไม่คำนึง
ว่าบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ๆ จะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่(8) ทำการกู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงินในนามของห้างฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของห้างฯ
(เว้นการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์และสิ่งอื่นที่เกี่ยวเนื่อง)

(9) รับทำครุภัณฑ์และจำหน่ายครุภัณฑ์ทุกชนิด

(10) รับแลกเปลี่ยนรถยนต์และจำหน่ายรถยนต์ทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์ คอนกรีตทุกชนิด

(12) ทำการขอให้ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสือจำประกันหรือรับรอง

วิธีการอื่นใด แก่ห้างหุ้นส่วนฯ ต่อบุคคลอื่น บุคคลธรรมดาขององค์กรของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของห้างฯ

 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **3 1014 00465 47 1**

ชื่อตัว ชื่อสกุล นาย กมลสิทธิ์ วาจากิจรุ่งเรือง
Name **Mr. Kamonsith**
Last name **Wachakitrungruang**
เกิดวันที่ **15 ก.พ. 2504**
Date of Birth **15 Feb. 1961**

ชาย 99/5 หมู่ที่ 9 ต.หนองโพธิ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
30 ม.ค. 2561
30 Jan. 2018
Date of Issue

รหัสประจำตัวประชาชน
(ตัวต่อท้ายเลขบัตร)
พื้นที่ของบัตรประชาชน

14 ก.พ. 2569
14 Feb. 2026
Date of Expiry


6701-05-01301434





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๖๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๙๕๗๕

ที่ สธ ๐๔๐๕.๕/

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง
ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗

เรียน หัวหน้ากลุ่มพัสดุ (ผ่านหัวหน้างานสัญญา)

ความเป็นมา

๑. ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ กรมควบคุมโรคได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง โดยใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามแบบโครงการจัดทำอาคารอยู่อาศัยรวมและบ้านพักของกรมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) แบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ จ้างแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๘๘ แผ่น และแบบรายละเอียด จำนวน ๗ แผ่น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร โดยก่อสร้าง ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเมื่อราคาประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว จ่ายจากเงินบำรุงของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบงาน ๕๔๐ วัน (๘ งวดงาน เงิน) **รา กำหนดสัญญาภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗**

๒. ตามสัญญาจ้างเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (ข้อ ๘) เสนอเลิกข้อความในวรรคแรกของข้อ ๔ ค่าจ้าง และการจ่ายเงิน และให้ใช้ข้อความในข้อนี้แทน “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และรับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒๔,๒๙๘,๒๘๗.๒๕ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๓. ตามหนังสือที่ สธ ๐๔๒๑.๑/๑๗๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันพิจารณาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ดังนี้

งวดงานที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๑ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒)
งวดงานที่ ๖ ข้อ ๖.๔ ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๒ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒)
งวดงานที่ ๗ ข้อ ๗.๒ ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๓ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒)
ซึ่งมีเงินลดจำนวน ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสตางค์) โดยทางฯ ยินดีให้หักเงินดังกล่าวในงวดที่ ๕ และขอใช้หลักประกันสัญญาฉบับเดิม

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ กำหนดว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือ เพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

๒. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของสูง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก วิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบและรายละเอียดของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

๓. กรณีที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดสระบุรี เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ส่งตารางเปรียบเทียบราคาประตู่-หน้าต่าง คิดเป็นเงินคืบจำนวน ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาท ห้าสิบบาท) โดยที่... ยินดีให้หักเงินดังกล่าวในงวดที่ ๕ และขอใช้หลักประกันสัญญานับเดิม

๓.๒ ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมพิจารณาตารางเปรียบเทียบราคาประตู่-หน้าต่าง พร้อมแบบแก้ไขประตู่-หน้าต่างของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพบว่า ในงวดงานที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ หน่วยงานโครงสร้างมีความขัดแย้งกับงานสถาปัตยกรรมโดยรูปแบบวงกบประตู่ - หน้าต่าง และช่องแสงตามแบบก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) แบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ รายการแบบขยายประตู่แผ่นที่ AR - ๕๒๐๑ ลำดับที่ ๑๗/๒๒ และรายการแบบขยายหน้าต่าง แผ่นที่ AR - ๕๒๕๑ ลำดับที่ ๑๘/๒๒ ไม่สามารถติดตั้งประตู่และหน้าต่างได้ เนื่องจากติดคานก่อสร้างทำให้จำเป็นต้องลดช่องแสงประตู่หน้าต่างดังกล่าวลง ๓๐ เซนติเมตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ตามสัญญา...

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง งวดที่ ๕- ๗ กลุ่มงานที่ ๑ ๑.๑ งานสถาปัตยกรรม ๑.๒.๖ งานประตู่ - หน้าต่าง	รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง กลุ่มงานที่ ๑ ๑.๑ งานสถาปัตยกรรม ๑.๒.๖ งานประตู่ - หน้าต่าง
งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๕.๔ ติดตั้งวงกบประตู่ - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๑ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒) - D๑ ประตู่ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด - W๑ หน้าต่าง หน้าต่าง ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด	งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๕,๓๑๖.๙๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสิบหกบาท เก้าสิบห้าสตางค์) ๕.๔ ติดตั้งวงกบประตู่ - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๑ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒) - D๑ ประตู่ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด - W๑ หน้าต่าง หน้าต่าง ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด
งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๖.๔ ติดตั้งวงกบประตู่ - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๒ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒) - D๑ ประตู่ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด - W๑ หน้าต่าง หน้าต่าง ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด	งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๖.๔ ติดตั้งวงกบประตู่ - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๒ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒) - D๑ ประตู่ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด - W๑ หน้าต่าง หน้าต่าง ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด
งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ๗.๒ ติดตั้งวงกบประตู่ - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๓ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒) - W๑ หน้าต่าง หน้าต่าง ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด	งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ๗.๒ ติดตั้งวงกบประตู่ - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๓ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒) - W๑ หน้าต่าง หน้าต่าง ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด

ราคาค่าวัสดุและแรงงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง งวดที่ ๕- ๗ กลุ่มงานที่ ๑ ๑.๑ งานสถาปัตยกรรม ๑.๒.๖ งานประตู่ - หน้าต่าง	รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง กลุ่มงานที่ ๑ ๑.๑ งานสถาปัตยกรรม ๑.๒.๖ งานประตู่ - หน้าต่าง
๑. งานประตู่ลูมิเนียม ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๖๐ เมตร ราคาค่าวัสดุต่อหน่วย ๑๐,๔๕๗.๔๕ บาท ราคาค่าแรงงานรวม ๘๓,๖๕๙.๖๐ บาท	๑. งานประตู่ลูมิเนียม ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๓๐ เมตร ราคาค่าวัสดุต่อหน่วย ๙,๒๕๐.๘๑ บาท ราคาค่าแรงงานรวม ๗๔,๐๐๖.๔๘ บาท
๒. งานประตู่ลูมิเนียม ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๖๐ เมตร ราคาค่าวัสดุต่อหน่วย ๑๐,๔๕๓.๐๗ บาท ราคาค่าแรงงานรวม ๑๒๕,๔๓๖.๘๔ บาท	๒. งานประตู่ลูมิเนียม ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๓๐ เมตร ราคาค่าวัสดุต่อหน่วย ๙,๒๕๖.๙๔ บาท ราคาค่าแรงงานรวม ๑๑๐,๙๓๖.๒๘ บาท
ราคารวม ๒ รายการ ๒๐๙,๐๙๖.๔๔ บาท	ราคารวม ๒ รายการ ๑๘๔,๙๖๙.๗๖ บาท
ค่า Factor F ๑.๒๓๐๓ บาท	ค่า Factor F ๑.๒๓๐๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๗,๒๕๑.๓๕ บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๕๖๘.๓๐ บาท

ซึ่งการลดงานดังกล่าวไม่ทำให้ประโยชน์ของการใช้งานลดลงแต่อย่างใด โดยผู้ควบคุมงานได้คำนวณเปรียบเทียบราคาเพิ่ม-ลด ตาม ปร.๔ และ ปร.๖ และได้ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารประกอบคุณสมบัติงานประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม (ในส่วนของช่องแสง) พร้อมมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๘๔-๒๕๓๐ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของรูปแบบและเอกสารที่ประกอบในสัญญาจ้าง เห็นควรให้นำมาใช้ในการก่อสร้างได้ โดยก่อสร้างตามข้อกำหนด คิดเป็นเงินลดทั้งสิ้น ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างยินดีให้หักเงินดังกล่าวในงวดที่ ๕ และขอใช้หลักประกันสัญญาฉบับเดิม ทั้งนี้การแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่กระทบระยะเวลาตามสัญญาจ้างเดิม โดยมีเอกสารประกอบทำสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| (๑) บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | จำนวน ๔ หน้า |
| (๒) แบบรูป | จำนวน ๑ หน้า |
| (๓) หนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง | จำนวน ๓ หน้า |

ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งตารางเปรียบเทียบราคาประตู-หน้าต่าง

๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ นั้น ถือเป็นการแก้ไขในสัญญาเดิม จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘๗ (๒) เนื่องจากโครงสร้างขัดแย้งกับงานสถาปัตยกรรม ติดคานก่อสร้างทำให้ไม่สามารถติดตั้งประตูและหน้าต่างได้ จำเป็นต้องลดช่องแสงประตูหน้าต่างดังกล่าว ลง ๓๐ เซนติเมตร โดยผู้ควบคุมงานได้เปรียบเทียบรายละเอียดของงาน รวมถึงราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขและได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าว ไม่เพิ่มระยะเวลาก่อสร้างและอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว มีเงินลดจำนวน ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสตางค์) โดยทางฯ ยินดีให้หักเงินดังกล่าวในงวดที่ ๕ และขอใช้หลักประกันสัญญาฉบับเดิม ตามสมควรเสนอกรมฯ อนุมัติแก้ไขจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ ตามข้อพิจารณาข้อ ๓

ขอเสนอ

เรียนกรมการปกครองเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดเสนอผู้อำนวยการกองบริหารการคลังนำเสนอกรมฯ

๑. อนุมัติให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง (ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) ในงานงวดที่ ๕ - งวดที่ ๗ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม งานประตู-หน้าต่าง คิดเป็นเงินลดจำนวนเงิน ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสตางค์) โดยทางฯ ยินดีให้หักเงินดังกล่าวในงวดที่ ๕ และขอใช้หลักประกันสัญญาฉบับเดิม ตามข้อพิจารณา ข้อ ๓

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) ที่แนบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๒๕๓๐
(นางสาวปรีสุทธิ์ บุญยุบล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ที่ สธ ๐๔๐๕.๕/ ๑๔๒ ลว. - ๑ ก.พ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ห้องผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
เลขที่..... ๓๖๖
รับวันที่..... ๑.ก.พ. ๒๕๖๗
ออกวันที่..... ๑.ก.พ. ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน
จ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่
๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๖) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ ในส่วนของการสถาปัตยกรรม
งานประตู-หน้าต่าง ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจรับ ขออนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้

งวดงานที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๑ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒)

งวดงานที่ ๖ ข้อ ๖.๔ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๒ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒)

งวดงานที่ ๗ ข้อ ๗.๒ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๓ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒)

มีเงินลดจำนวนเงิน ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสตางค์) รายละเอียด
ตามบัญชีเปรียบเทียบราคาก่อสร้างกรณีงานเพิ่ม-งานลด ของผู้ควบคุมงาน (นาย ตติพงษ์ พึ่งอัน ตำแหน่ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน) ซึ่งได้ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารประกอบคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด
ของรูปแบบและเอกสารที่ประกอบในสัญญาจ้าง และห้างฯ ยินดีให้หักเงินในงวดที่ ๕ และขอใช้หลักประกัน
สัญญาฉบับเดิม นั้น

กลุ่มพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า กรณีที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ ในส่วนของการสถาปัตยกรรม งานประตู-หน้าต่าง
ดังกล่าวข้างต้น เป็นการแก้ไขที่มีความจำเป็นต้องแก้ไข โดยสัญญาจ้างการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐ
เสียประโยชน์ ตามมาตรา ๙๗ (๒) เนื่องจากโครงสร้างขัดแย้งกับสถาปัตยกรรม ติดคานก่อสร้างทำให้ไม่สามารถ
ติดตั้งประตูและหน้าต่างได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขของและประตูหน้าต่างให้เหมาะสมสมควรเสนอรกรมา ขออนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) แจ้งว่ายินดีให้หักเงิน จำนวน ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท
(สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสตางค์) ในงวดที่ ๕ และขอใช้หลักประกันสัญญาฉบับเดิม ทั้งนี้
การแก้ไขดังกล่าวไม่เพิ่มระยะเวลาก่อสร้างและอยู่ในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดเสนอรกรมา

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง)
จำนวน ๒ หลัง (ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไข
เปลี่ยนแปลง สัญญาเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง
ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ ในส่วนของการสถาปัตยกรรม งานประตู-หน้าต่าง รายละเอียดตามข้อพิจารณาข้อ ๓
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) แจ้งว่ายินดีให้หักเงิน จำนวน ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่น
เก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสตางค์) ในงวดที่ ๕ และขอใช้หลักประกันสัญญาฉบับเดิม และไม่เพิ่มเวลา
การทำงานก่อสร้าง

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวนันทพร วงษ์ละคร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาราชการในตำแหน่งแทนหัวหน้ากลุ่มพัสดุ

๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค

ห้องรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
เลขรับ ๘๕๕
วันที่ 1 ก.พ. 2567
เวลา ๑๖.๔๒ น.

ที่ สธ ๐๔๐๕ / ๒๗๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๗
เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค

เพื่อโปรด

๑. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง (ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง ในงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๗ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม งานประตู่-หน้าต่าง รายละเอียดตามข้อพิจารณาข้อ ๓ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) แจ้งว่ายินดีให้หักเงิน จำนวน ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสตางค์) ในงวดที่ ๕ และขอใช้หลักประกันสัญญาฉบับเดิม และไม่เพิ่มเวลาการทำงานก่อสร้าง

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ก่อสร้าง ต่อไปโดยเป็นพระคุณ

(นายนิรุติธรรม ธีระธรรมากร)
ผู้อำนวยการกองบริหารการสิ่ง
ก.พ. ๒๕๖๗

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

(นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗

- ☐ กลุ่มบริหารทั่วไป
☐ กลุ่มงบประมาณ
☐ กลุ่มบัญชี
☐ กลุ่มการเงิน
☒ กลุ่มพัสดุ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗
☐ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
☐ กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ
- ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗
๑๖.๔๒ น.



วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

งานด้านที่ ๗ ข้อ ๗.๒ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๓ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒)

ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพบว่า ในงวดงานที่ ๕ - ๗ หน้างานโครงสร้างมีความขัดแย้งกับงานสถาปัตยกรรมโดยรูปแบบวงกบประตู - หน้าต่าง และช่องแสงตามแบบก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) แบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ รายการแบบขยายประตู แผ่นที่ AR - ๕๒๐๑ ลำดับที่ ๑๗/๒๒ และรายการแบบขยายหน้าต่าง แผ่นที่ AR - ๕๒๕๑ ลำดับที่ ๑๘/๒๒ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ไม่สามารถติดตั้งประตูและหน้าต่างได้เนื่องจากติดคานก่อสร้างทำให้จำเป็นต้องลดช่องแสงประตูหน้าต่างดังกล่าวลง ๓๐ เซนติเมตร โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันพิจารณาขอปรับแก้ไขสัญญา ดังนี้

๑. แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา งานประตู - หน้าต่าง ตามรูปแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง งวดงานที่ ๕ กลุ่มงานที่ ๑ งานสถาปัตยกรรม ๑.๒.๖ ตามแบบก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) แบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ รายการแบบขยายประตู แผ่นที่ AR - ๕๒๐๑ ลำดับที่ ๑๗/๒๒ และรายการแบบขยายหน้าต่าง แผ่นที่ AR - ๕๒๕๑ ลำดับที่ ๑๘/๒๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบปัญหาการจ้างก่อสร้างงานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม (ในส่วนช่องช่องแสง) อาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง เนื่องจากติดคานก่อสร้างทำให้ไม่สามารถติดตั้งประตูและหน้าต่างได้ จึงจำเป็นต้องลดช่องแสงประตูหน้าต่างดังกล่าวลง ๓๐ เซนติเมตร ผู้ควบคุมงานจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พิจารณาการปฏิบัติงาน ณ หน้างานก่อสร้าง ปรากฏผลการพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้ จึงทำให้ขนาดประตู-หน้าต่าง มีขนาดลดลง

งานประตูเดิม ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๖๐ เมตร ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากติดคานก่อสร้าง ขอเปลี่ยนแปลงลดช่องแสง ๓๐ เซนติเมตร ทำให้ขนาดประตูลดลงเหลือ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๓๐ เมตร วัสดุคงเดิม

งานหน้าต่างเดิม ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๖๐ เมตร ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากติดคานก่อสร้างขอเปลี่ยนแปลงลดช่องแสง ๓๐ เซนติเมตร ทำให้ขนาดประตูลดลงเหลือ ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๓๐ เมตร วัสดุคงเดิม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม (ในส่วนช่องช่องแสง) ตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน และจากการเปรียบเทียบแบบแสดงรายการปริมาณงาน ราคาวัสดุ งานที่กำหนดกับที่ผู้รับจ้างดำเนินการขอใช้ประตู - หน้าต่าง (อลูมิเนียม) ประตู ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๓๐ เมตร หน้าต่าง ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๓๐ เมตร มีมาตรฐานรับรองผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) โดยตามแบบสรุปผลการเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง (ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทยก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑/๑ โดยนายกิตติพงษ์ พึ่งอัน ผู้ควบคุมงานได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง)รายละเอียดดังนี้

ตามรูปแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง งานงานที่ ๕- ๗ กลุ่มงานที่ ๑ งานสถาปัตยกรรม ๑.๒.๖ ตามแบบก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง แบบเลขที่ ๑๑๐๖๒	รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๑. งานประตูลูมิเนียม ขนาด ๑.๐๐ X ๒.๖๐ เมตร ราคาทุนต่อหน่วย ๑๐,๔๕๗.๔๕ บาท ราคาทุนรวม ๘๓,๖๕๙.๖๐ บาท	๑. งานประตูลูมิเนียม ขนาด ๑.๐๐ X ๒.๓๐ เมตร ราคาทุนต่อหน่วย ๙,๒๕๐.๘๑ บาท ราคาทุนรวม ๗๔,๐๐๖.๔๘ บาท
๒.งานประตูลูมิเนียม ขนาด ๐.๘๐ X ๒.๖๐ เมตร ราคาทุนต่อหน่วย ๑๐,๔๕๓.๐๗ บาท - ราคาทุนรวม ๑๒๕,๔๓๖.๘๔ บาท	๒. งานประตูลูมิเนียม ขนาด ๐.๘๐ X ๒.๓๐ เมตร ราคาทุนต่อหน่วย ๙,๒๔๖.๙๔ บาท ราคาทุนรวม ๑๐,๙๓๖.๒๘ บาท

รูปแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง งานงานที่ ๕- ๗ กลุ่มงานที่ ๑ งานสถาปัตยกรรม ๑.๒.๖ ตามแบบก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง แบบเลขที่ ๑๑๐๖๒	รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ราคารวม ๒ รายการ ๒๐๙,๐๙๖.๔๔ บาท ค่า Factor F ๑.๒๓๐๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๗,๑๕๑.๓๕ บาท	ราคารวม ๒ รายการ ๑๘๔,๙๖๙.๗๖ บาท ค่า Factor F ๑.๒๓๐๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๕๖๘.๓๐ บาท

รวมเงินที่ต้องตัดออกจากยอดเงินสัญญาจ้างก่อสร้าง (๒๐๙,๐๙๖.๔๔ - ๑๘๔,๙๖๙.๗๖) ๒๔,๑๒๖.๖๘ บาท X Factor (๑.๒๓๐๓) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทสามสตางค์) ในงวดที่ ๕ รายการที่ ๕.๔ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง และช่องแสงชั้นที่ ๑ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒), งวดงานที่ ๖ ข้อ ๖.๔ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๒ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒) และงวดงานที่ ๗ ข้อ ๗.๒ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๓ (อาคาร ๑ และอาคาร ๒) ตามบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) จำนวน ๒ หลัง แบบ ปร.๖ เพื่อเสนอกรมควบคุมอาคารพิจารณาปรับแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยทางผู้รับจ้าง สวท สวิทย์ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ยินดีให้หักเงินปรับลดค่าก่อสร้างงานประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม (ในส่วนของช่องแสง) ในงวดงานที่ ๕ และผู้รับจ้างขอใช้หลักประกันสัญญาเดิม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งนี้ ผู้ควบคุมงาน จากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ความเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลา และจำนวนเงินในงวดงานที่ ๖-๗ พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ข้อเสนอ

ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ หลัง ในงวดงานที่ ๕ งวดงานที่ ๖ และงวดงานที่ ๗ และปรับลดค่างานประติ - ผนังต่าง (ในส่วนช่องแสง) โดยหักจากผู้รับจ้าง เป็นเงินจำนวน ๒๙,๖๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบสามบาทห้าสตางค์) ในงวดงานที่ ๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทนบุรณ์ กองจินดา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณพพงษ์ บัว...

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคงกฤ...

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ผู้อำนวยการกองแบบแผนหรือผู้แทน

ชื่อ.....กรรมการ

(นายธงชัย บัว...

นิติกร

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางนงนภัส สีดาพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
